


## Stand van zaken Project Macropedius juni 2024

Op 1 februari 2024 heeft uw raad tijdens de bespreking van de locatiekeuze voor de nieuwbouw van het Macropedius ingestemd met variant 1 A, gelegen op het Sportpark Molenbroek als beoogde locatie voor de nieuwbouw.

Middels een amendement heeft u het college verzocht uw raad minimaal één keer per kwartaal te informeren over de stand van zaken van het project. Via dit document praten we u bij over de situatie per juni 2024.

### Projectplan Macropedius

Tijdens de commissievergadering Sociaal Domein, Sport en Onderwijs op 25 april 2024 is het projectplan voor de nieuwbouw van het Macropedius gepresenteerd. In de roadmap (zie afbeelding) is de fasering voor de diverse deelprojecten weergegeven, inclusief de go/no go momenten waarmee we voor definitieve besluitvorming naar uw raad komen.

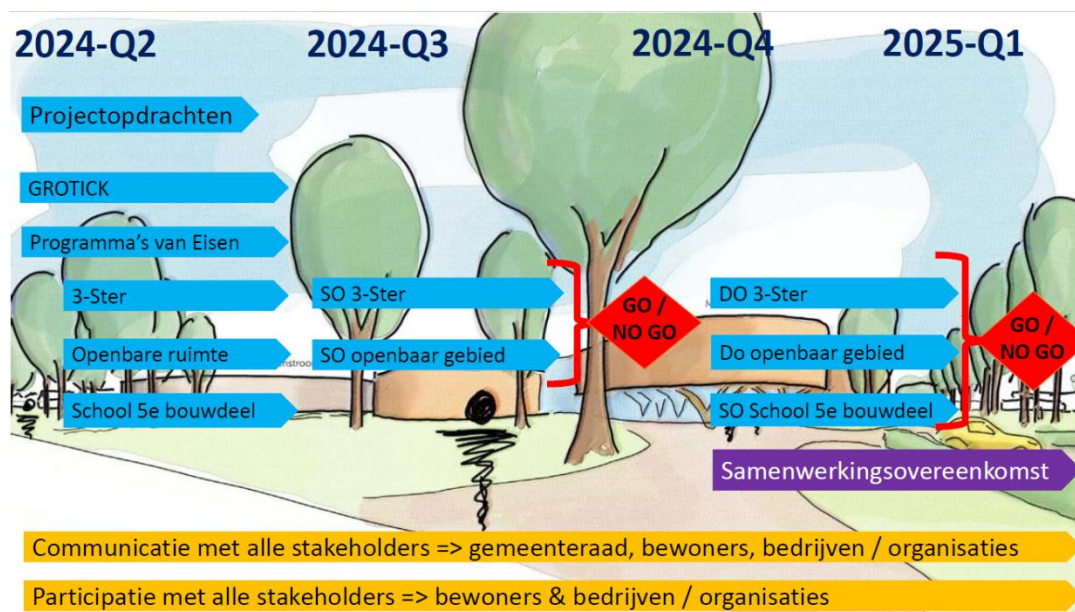

In Q2 van dit jaar zijn op basis van het projectplan de volgende zaken uitgevoerd:

- Het besluitvormingsproces rondom de **projectopdrachten** is ingezet. In Q3 neemt het college een besluit op de projectopdrachten. Deze projectopdrachten worden vergezeld met een kader voor het participatietraject van de projecten.

Het is op dit moment nog niet zinvol te starten met de projectopdracht voor het deelproject van de school en het 5<sup>e</sup> bouwdeel, hiervoor moet de gemeenteraad de definitieve go geven voor de locatie.

- Voor de **uitwerking van de verkeerssituatie** rondom het sportpark loopt op dit moment een inkoopproces. Doel is een verkeerskundig adviesbureau te selecteren,

dat na de bouwvakvakantie aan de slag gaat om samen met omwonenden scenario's te ontwikkelen.

- Het **communicatieplan**, gebaseerd op het Sportpark Molenbroek als beoogde locatie, is in concept gereed. Na behandeling in het college zullen we dit, zoals eerder toegezegd, voor de zomervakantie met u delen.
- Hierop vooruitlopend is de gemeente ook bezig om een projectenpagina op de gemeentelijke website te zetten. Deze pagina is voor alle inwoners en belangstellenden bereikbaar voor informatie. Hierop worden ook regelmatig updates geplaatst.

Voor het volgende kwartaal (Q3 2024) staan de volgende acties op de agenda:

- De projectenpagina op de website komt live waar updates over het project en de deelprojecten worden verzorgd.
- De projectopdrachten inclusief participatiekaders worden voor besluitvorming voorgelegd aan het college.
- Het communicatieplan wordt per RIN verzonden naar de gemeenteraad.
- Kort na de zomer wordt het inkooptraject van het verkeerskundig bureau afgrond en zijn zij gestart met de opdracht.
- In Q3 start de projectgroep deelproject 'herhuisvesting De Driester' op. Er worden gesprekken gevoerd met de verschillende verenigingen van de Driester.
